

Prüfprotokoll für den Messaufbau bei Kaskadenschaltung

Kunde

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Anlagenstandort

Straße, Nr.


PLZ, Ort

Flur

Flurstück

Gemarkung

Stadtwerke

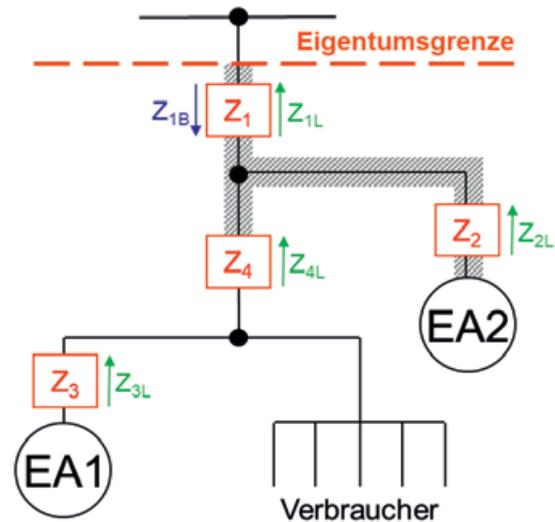

Z₁: Zähler für Bezug und Lieferung
 Z₂, Z₃, Z₄: Zähler für Lieferung

Zählerbeschriftung wurde durchgeführt und auf Zuordnung nach dem Messkonzept B4 Kaskadenschaltung geprüft. ja
 Im schraffierten Bereich sind keine Verbraucher angeschlossen!

2.) Anlagenzuordnung wurde geprüft: ja

EA1 = Energieträger Leistung

EA2 = Energieträger Leistung

3.) Prüfung der Messwerte:

a.) EA1 in Betrieb EA2 außer Betrieb ja

Energiemenge der Erzeugung an Z_{2L} bleibt unverändert ja

Einspeiseenergiemenge an Z_{4L} ist gleich groß wie an Z_{1L} ja

Energiemenge der Erzeugung an Z_{3L} ≥ Energiemenge der Einspeisung an Z_{4L} ja

b.) EA1 außer Betrieb EA2 in Betrieb ja

Energiemenge der Erzeugung an Z_{3L} bleibt unverändert ja

Energiemenge der Einspeisung an Z_{4L} bleibt unverändert ja

Energiemenge der Erzeugung an Z_{2L} ≥ Energiemenge der Einspeisung an Z_{1L} ja

c.) EA1 und EA2 in Betrieb ja

Energiemenge der Erzeugung an Z_{3L} ≥ Energiemenge der Einspeisung an Z_{4L} ja

Energiemenge der Erzeugung an Z_{2L} ≥ Energiemenge der Einspeisung an (Z_{1L}-Z_{4L}) ja

Energiemenge der Einspeisung an Z_{1L} ≥ Energiemenge der Einspeisung an Z_{4L} ja

Sobald eine Prüfung nicht mit „Ja“ angekreuzt wurde, muss der Messaufbau nochmals geprüft werden.

Datum, Unterschrift Elektrofachfirma

Datum, Unterschrift Anlagenbetreiber
